事業戦略スクール「知足」

ガントチャート

Gantt Chart

CONTENTS

SECTION 01 ガントチャートとは

SECTION 02 ガントチャートの活用方法

SECTION 03 Before / After

SECTION 04 まとめ

SECTION 05 ダウンロードコンテンツ

SECTION 06 課題

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

01

ガントチャートとは

Gantt Chart

ガントチャートとは、タスクを横軸の時間スケール上に視覚化することで、プロジェクトの進行状況を管理するツールです。

ガントチャートの基本構成

1. 縦軸（タスク一覧）

プロジェクトの作業内容をリスト形式で表示する。各タスクはプロジェクトの具体的な作業を表す。

2. 横軸（時間スケール）

時間軸として日、週、月、または年が設定される。これにより、プロジェクトの期間を細かく管理することが可能である。

3. バー（タスクの進捗状況）

各タスクの開始日と終了日を棒グラフで視覚化する。また、進行中や完了済みを色分けすることで、進捗状況もわかりやすくなる。

4. 依存関係（線や矢印）

タスク間の関係性を線や矢印で表現する。これにより、1つのタスクの遅延が他のタスクに与える影響を把握できる。

POINT

縦軸にタスク、横軸に時間を配置し、それぞれのタスクの開始日と終了日を棒グラフ形式で表現する。これにより、プロジェクト全体を一目で把握することが可能。

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

02

ガントチャートの活用方法

Gantt Chart

●ガントチャートを効果的に活用するための手順は、以下のとおりです。

STEP1

プロジェクトの目標を明確化

プロジェクトの目的や成果物を設定する。

STEP2

タスクの洗い出し

必要な作業をリストアップし、開始日・終了日を設定する。

STEP3

依存関係の特定

タスク間の優先順位や依存関係を明確にする。

STEP4

ガントチャート作成

ガントチャートツールを使って、タスクを時間軸に配置する。

STEP5

進捗のモニタリング

定期的にガントチャートを見直し、進捗状況やスケジュールの遅れを確認する。

POINT

- 目標達成のために必要な作業は細かく分解し、リストアップする
- 定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて計画を修正する
- プロジェクト終了後、計画と実績を比較し、改善点を洗い出す

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

03

Before / After

Gantt Chart

Before

WBS 番号	タイトル	開始日	終期	期間(day)	タスク完了率
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%
				0	0%

第1期(2021–2022) 上半期 下半期 第2期(2022–2023) 上半期 下半期 第3期(2023–2024) 上半期 下半期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

After

WBS 番号	タイトル	開始日	終期	期間(day)	タスク完了率
1	**人事・組織**				
1.1	**採用強化**			0	0%
1.1.1	人材要件（スキル・マインド）の整理	2021/10/01	2021/12/31	90	0%
1.1.2	採用媒体の選定	2022/01/01	2022/02/28	57	0%
1.1.3	Competencyの言語化	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.1.4	面談・採用フローの決定	2022/04/01	2022/09/30	179	0%
1.1.5	人材募集・面談の開始	2022/04/01	2022/09/30	179	0%
1.2	**文化/風土醸成**			0	0%
1.2.1	マインド・行動指針の言語化	2021/10/01	2021/12/31	90	0%
1.2.2	文化を浸透するための会議体やコミュニケーション設計	2021/11/01	2022/01/31	90	0%
1.2.3	会社の全体の方針性を社員に月次で共有	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.2.4	文化・ビジョンを共有する機会の創出				
1.3	**オンボーディング**			0	0%
1.3.1	採用時オンボーディング（90日間）の設計と実行	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.4	**組織構造・役職の定義**			0	0%
1.4.1	役職ごとの役割・責任の明文化	2022/04/01	2022/06/30	89	0%
1.4.2	職種・ポジションの定義と明文化	2022/07/01	2022/09/30	89	0%
1.4.3	人事評価制度	2022/07/01	2022/09/30	89	0%
1.4.4	給与レンジの定義	2022/10/01	2023/09/30	359	0%
1.4.5	目標設定方法の定義	2022/10/01	2023/09/30	359	0%
1.4.6	目標設定面談・評価面談の設計と実行	2022/10/01	2023/09/30	359	0%

第1期(2021–2022) 上半期 下半期 第2期(2022–2023) 上半期 下半期 第3期(2023–2024) 上半期 下半期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

03

Beforeの説明

Gantt Chart

ガントチャートを使わない 場合の問題点として、次のようなことが挙げられます。

問題点 01

プロジェクト全体のスケジュールが曖昧

プロジェクト全体のスケジュールが明確に示されていないため、関係者がどのようなタスクが進行中で、どの時点で何を達成するべきかを把握できない。

問題点 02

タスクの優先順位や依存関係が不明確

タスクの間にある優先順位や依存関係が整理されていないため、無駄な作業や遅延が発生する。

問題点 03

チームメンバー間の連携が不足

チームメンバーがそれぞれの役割や現在の進捗状況を把握できず、連携が取りにくい。

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

03

Afterの説明

Gantt Chart

WBS番号	タイトル	開始日	期限	期間(day)	タスク完了率
1	**人事・組織**				
1.1	**採用強化**			0	0%
1.1.1	人材要件（スキル・マインド）の整理	2021/10/01	2021/12/31	90	0%
1.1.2	採用媒体の選定	2022/01/01	2022/02/28	57	0%
1.1.3	Competencyの言語化	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.1.4	面談・採用フローの決定	2022/04/01	2022/09/30	179	0%
1.1.5	人材募集・面談の開始	2022/04/01	2022/09/30	179	0%
1.2	**文化/風土醸成**			0	0%
1.2.1	マインド・行動指針の言語化	2021/10/01	2021/12/31	90	0%
1.2.2	文化を浸透するための会議体やコミュニケーション設計	2021/11/01	2022/01/31	90	0%
1.2.3	会社の全体の方向性を社員に月次で共有	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.2.4	文化・ビジョンを共有する機会の創出				
1.3	**オンボーディング**			0	0%
1.3.1	採用時オンボーディング（90日間）の設計と実行	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.4	**組織構造・役職の定義**			0	0%
1.4.1	役職ごとの役割・責任の明文化	2022/04/01	2022/06/30	89	0%
1.4.2	職種・ポジションの定義と明文化	2022/07/01	2022/09/30	89	0%
1.4.3	人事評価制度	2022/07/01	2022/09/30	89	0%
1.4.4	給与レンジの定義	2022/10/01	2023/09/30	359	0%
1.4.5	目標設定方法の定義	2022/10/01	2023/09/30	359	0%
1.4.6	目標設定面談・評価面談の設計と実行	2022/10/01	2023/09/30	359	0%
2	**事業戦略/売上**				
2.1	**マーケティング戦略設計・サービス定義**			0	0%
2.1.1	自社のターゲットセグメント・ニーズ・KBFの定義	2022/01/01	2022/09/30	269	0%
2.1.2	自社のサービス内容・価格の設計	2022/01/01	2022/06/30	179	0%
2.1.3	マーケティング・セールス方針の決定	2022/02/01	2022/05/30	119	0%
2.1	**リード・新規売上獲得**			0	0%
2.1.1	リード獲得～営業～運用～CS/FB体制の構築	2022/01/01	2022/09/30	269	0%
2.1.2	広報・PR機能の強化	2022/01/01	2022/06/30	179	0%
2.1.3	顧客紹介してくれる重要人物の開拓	2022/02/01	2022/05/30	119	0%
2.1.4	コンサルティング領域におけるセルアップ能力の向上	2022/03/01	2022/06/30	119	0%
1.3	**デリバリーの仕組み化・育成**			0	0%
1.3.1	売上・利益生産性KPIの設定	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.3.2	採用時オンボーディング（90日間）の設計と実行	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
1.3.3	プロジェクトオンボーディングの設計と実行	2022/01/01	2022/03/31	90	0%
2.3	**運用/CS**			0	0%

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

04

まとめ

Gantt Chart

ガントチャートの重要性

- プロジェクトの進行状況を視覚化し、スケジュール通りに達成するために不可欠なツールである

活用のメリット

- タスクと時間管理が効率化し、プロジェクトの透明性が向上
- チーム全体で進捗を共有しやすくなるため、コミュニケーションが円滑化する

実践のポイント

- タスクの詳細な設定と依存関係の整理を行い、現実的なスケジュールを立てる
- 定期的な更新と確認を行い、柔軟に対応することが重要

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

05

ダウンロードコンテンツ

Gantt Chart

Excel形式やプロジェクト管理ソフトで使用可能なガントチャートテンプレートをダウンロードできます。

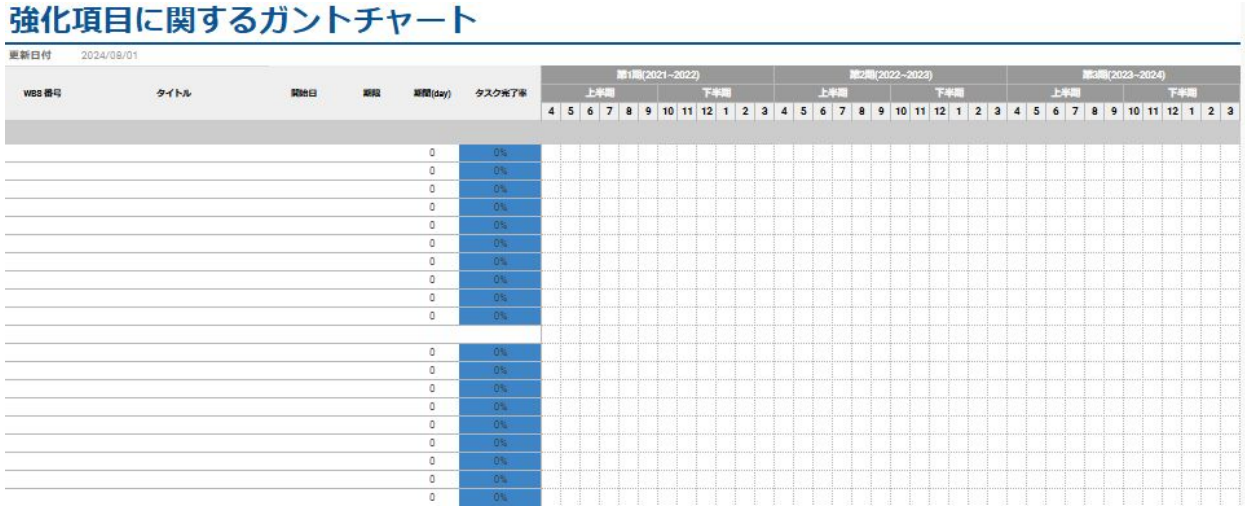

▼ダウンロードリンクはこちら
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWkoyTXAbvlaIsuxxXbkilpGfzsaE6ICcVpR2_YmNt0/edit?gid=929810448#gid=929810448

© 2024 Isshi Inc.

SECTION

06

課題

Gantt Chart

現在の事業における
ガントチャートを引いてみましょう！



© 2024 Isshi Inc.
